

PROJEKTBERICHT

Anhang

Projektplanung: Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag

Booklet-Projekt · Präsentation am 08.10.2026

Protokoll-Vorlage	Seite 2
Projektskizze	Seite 3
Projektstrukturplan	Seite 5
Projektablaufplan (Tabelle, Netzplan, Gantt-Diagramm)	Seite 6

BESPRECHUNG

Protokoll

Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag · Yasin & Mido

Projekt	Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag
Datum	
Uhrzeit	
Ort / Form	
Teilnehmer	
Thema	

Besprochene Punkte	
Ergebnisse / Beschlüsse	

Aufgaben

Wer	Was	Bis wann

Offene Punkte	
Nächster Termin	
Protokollführer	

PROJEKTSKIZZE

Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag

Fach GP (Geschäftsprozesse) · Kaufleute für Büromanagement · Präsentation am 08.10.2026

1. Vorläufiger Arbeitstitel

Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag – Booklet und interaktive Stunde zur Prüfungsvorbereitung im Fach GP

2. Einreicher / Ansprechpartner

Yasin & Mido · Betreuende Lehrkraft: Frau Schorr-Fischer · Klasse: [eintragen]

3. Vorläufige Umschreibung der Projektidee

Wir werden ein Booklet und eine interaktive Unterrichtsstunde zum Thema „Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag“ erstellen, um Mitschüler auf die schriftliche IHK-Abschlussprüfung am 25.11.2026 vorzubereiten (Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde). Inhaltlich geht es um die sechs Prüfungspunkte Beginn und Dauer der Ausbildung, tägliche Ausbildungszeit, Vergütung, Urlaub, Probezeit und Kündigung sowie um die Pflichten von Auszubildenden und Ausbildenden. Rechtsgrundlage ist vor allem das Berufsbildungsgesetz (BBiG).

Das Booklet soll 13 Seiten umfassen: kurze Kapitel in einfacher Sprache, ein Merkblatt für eine Seite, Aufgaben (Vertrags-Detektiv, IHK-Fälle, Wahr oder falsch) mit Erwartungshorizont, ein Mini-Quiz, Glossar und Quellenverzeichnis. Die Praxisbeispiele sollen aus einem anonymisierten, eigenen Ausbildungsvertrag stammen.

In der Unterrichtsstunde (bis zu 45 Minuten) stellen wir das Projekt kurz vor und üben danach mit der Klasse in zwei Aktivitäten: Rote/Grüne Karte und Vertrags-Detektiv. Dazu schreiben wir einen Projektbericht.

4. Vorteile / erwarteter Nutzen

- **Mitschüler:** Zum Ausbildungsvertrag gibt es bisher kein kompaktes Lernmaterial mit Aufgaben und Lösungen. Unser Booklet erklärt die Regeln in einfacher Sprache statt Gesetzesdeutsch.
- **Prüfungsnah:** Der IHK-Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde dauert 60 Minuten, besteht aus fallbezogenen Aufgaben und zählt 10 % der Gesamtnote. Unsere Aufgaben üben genau solche Fälle.
- **Interaktiv:** Die Klasse lernt durch Mitmachen statt durch Zuhören.
- **Wir selbst:** Wir lernen die Regeln aus dem eigenen Ausbildungsvertrag sicher anzuwenden und setzen die Methoden aus dem Projektmanagement-Unterricht praktisch um.

5. Umsetzung

Die Arbeit gliedert sich in vier Stufen, die im Projektstrukturplan als Teilaufgaben und Arbeitspakete (AP) wiederkehren:

	Stufe	Inhalt	AP
1	Vorbereitung	Projektskizze und Ziele erstellen; Planung mit Projektstrukturplan und Projektablaufplan	1–3
2	Praxisbeispiele	Praxisbeispiele sammeln und anonymisieren	4
3	Booklet und Aufgaben	Booklet mit Kapiteln, Merkblatt und Mini-Quiz erstellen; Aufgaben mit Erwartungshorizont erstellen	5–6
4	Präsentation und Abschluss	Präsentation erstellen; Material, Korrekturlesen und Probelauf; Projektbericht schreiben; Präsentation halten (08.10.)	7–10

Aufgabenverteilung: Recherche und Texte liegen bei Yasin; Vertragssichtung, Praxisbeispiele, Grafiken und Korrekturlesen bei Mido; Gliederung, Layout und Präsentation machen wir gemeinsam. Projektstrukturplan und Projektablaufplan liegen im Anhang.

6. Laufzeit

4 Wochen (10.09. – 08.10.2026), geplant in Arbeitstagen Montag bis Freitag; die Umsetzung findet im Oktober statt:

Zeitraum	Schwerpunkt	AP
Woche 1 (10.09.–16.09.)	Projektskizze und Ziele erstellen	1
Woche 2 (17.09.–23.09.)	Projektstrukturplan erstellen, Projektablaufplan beginnen, Praxisbeispiele sammeln	2–4
Woche 3 (24.09.–30.09.)	Projektablaufplan abschließen, Praxisbeispiele sammeln und anonymisieren	3–4
Woche 4 (01.10.–07.10.)	Umsetzung: Booklet, Aufgaben, Präsentation, Material und Probelauf, Projektbericht	5–9
08.10.2026	Präsentation halten	10

Meilensteine: M1 Projektskizze und Ziele fertig (16.09.) · M2 Planung und Praxisbeispiele fertig (28.09.) · M3 Booklet und Aufgaben fertig (06.10.) · M4 Präsentation und Material fertig (07.10.) · M5 Präsentation gehalten (08.10.).

7. Finanzierung

Für das Projekt entstehen keine nennenswerten Kosten. Benötigt werden digitale Recherchemittel, ein Computer und ein Canva-Zugang für das Layout (vorhanden). Für den Druck von Booklet, Merkblatt und Material: [Anzahl der Ausdrücke und Drucker klären].

Unsere zwei SMART-Ziele

Ziel 1 – Wissen über den Ausbildungsvertrag

Bis zum 08.10.2026 kennen wir die wichtigsten Regelungen aus Berufsbildungsgesetz und Ausbildungsvertrag und können für jeden der sechs Prüfungspunkte (Beginn und Dauer, tägliche Ausbildungszeit, Vergütung, Urlaub, Probezeit, Kündigung) mindestens ein Beispiel erklären.

Zum Beispiel:


- Beginn und Dauer** → Verkürzung auf gemeinsamen Antrag von Azubi und Ausbildenden (§ 8 Abs. 1 BBiG)
- Tägliche Ausbildungszeit** → Jugendliche höchstens 8 Stunden täglich (§ 8 JArbSchG)
- Vergütung** → mindestens 724 € im 1. Jahr bei Ausbildungsbeginn 2026 (§ 17 BBiG)
- Urlaub** → ab 18 Jahren mindestens 24 Werktage, darunter 25, 27 oder 30 (§ 3 BurlG, § 19 JArbSchG)
- Probezeit** → ein bis vier Monate (§ 20 BBiG)
- Kündigung** → in der Probezeit jederzeit ohne Frist, aber schriftlich (§ 22 Abs. 1 und 3 BBiG)

Ziel 2 – Anwendung im Ausbildungsalltag

Bis zur Präsentation am 08.10.2026 finden Mitschüler im Vertrags-Detektiv mindestens 4 von 5 Fehlern und begründen sie mit der passenden Regel.

Zum Beispiel:

- Probezeit von sechs Monaten** → höchstens vier Monate (§ 20 BBiG)
- 650 € im 1. Ausbildungsjahr** → mindestens 724 € im 1. Jahr (§ 17 BBiG)
- 9 Stunden tägliche Ausbildungszeit** → Jugendliche höchstens 8 Stunden täglich und 40 pro Woche (§ 8 JArbSchG)
- 20 Werktage Urlaub** → mindestens 24 Werktage, Jugendliche je nach Alter 25 bis 30 (§ 3 BurlG, § 19 JArbSchG)
- Kündigung in der Probezeit nur mit vier Wochen Frist** → in der Probezeit jederzeit ohne Frist, schriftlich (§ 22 Abs. 1 und 3 BBiG)

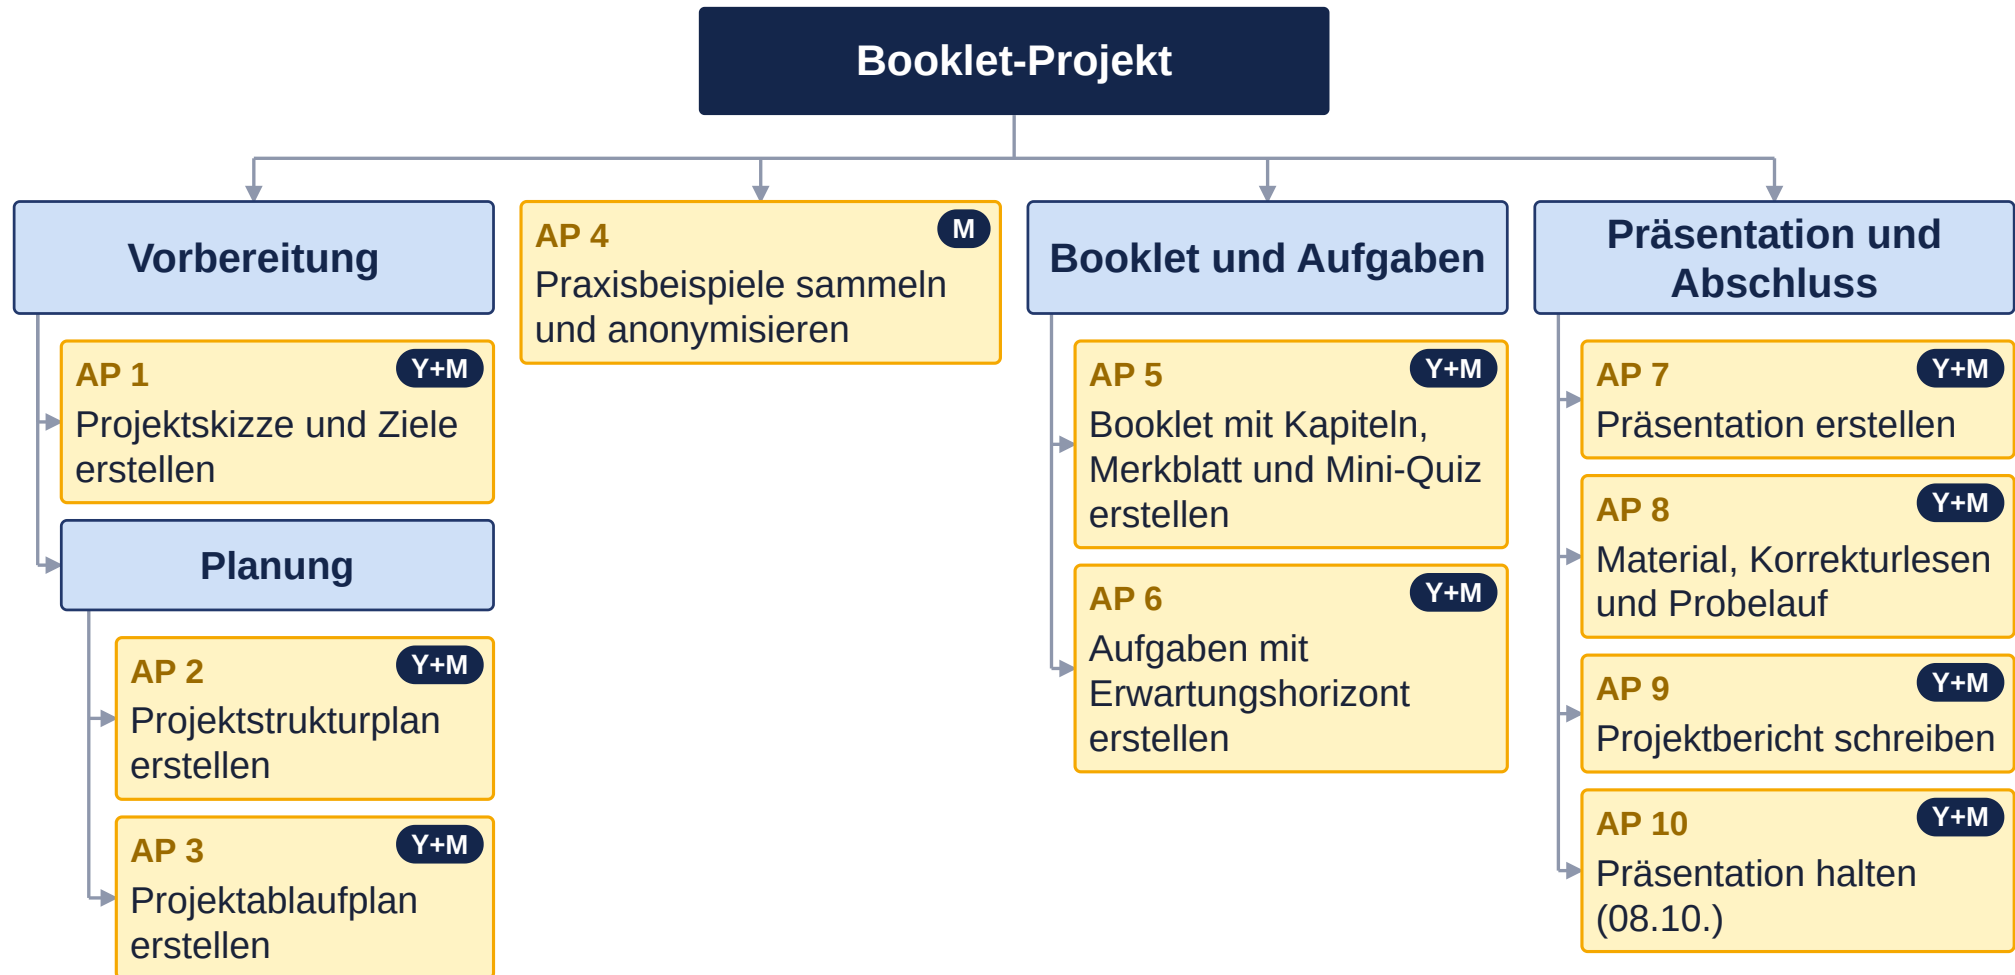

□ Teilaufgabe □ Arbeitspaket (AP) Verantwortlich: Y = Yasin · M = Mido · Y+M = beide gemeinsam

Tabelle der Arbeitspakete

Booklet-Projekt
Yasin & Mido


Nr.	Arbeitspaket	Dauer (Arbeitstage)	Start (Soll)	Ende (Soll)	Vorgänger	Verantwortlich	Ist
1	Projektskizze und Ziele erstellen	5	10.09.2026	16.09.2026	–	Yasin & Mido	[eintragen]
2	Projektstrukturplan erstellen	4	17.09.2026	22.09.2026	1	Yasin & Mido	[eintragen]
3	Projektablaufplan erstellen	4	23.09.2026	28.09.2026	2	Yasin & Mido	[eintragen]
4	Praxisbeispiele sammeln und anonymisieren	8	17.09.2026	28.09.2026	1	Mido	[eintragen]
5	Booklet mit Kapiteln, Merkblatt und Mini-Quiz erstellen	4	01.10.2026	06.10.2026	3, 4	Yasin & Mido	[eintragen]
6	Aufgaben mit Erwartungshorizont erstellen	2	01.10.2026	02.10.2026	3, 4	Yasin & Mido	[eintragen]
7	Präsentation erstellen	2	05.10.2026	06.10.2026	6	Yasin & Mido	[eintragen]
8	Material, Korrekturlesen und Probelauf	1	07.10.2026	07.10.2026	5, 7	Yasin & Mido	[eintragen]
9	Projektbericht schreiben	5	01.10.2026	07.10.2026	3	Yasin & Mido	[eintragen]
10	Präsentation halten (08.10.)	1	08.10.2026	08.10.2026	8, 9	Yasin & Mido	[eintragen]

Nr.	Meilenstein (Soll)	Termin
M1	Projektskizze und Ziele fertig	16.09.2026
M2	Planung und Praxisbeispiele fertig	28.09.2026
M3	Booklet und Aufgaben fertig	06.10.2026
M4	Präsentation und Material fertig	07.10.2026
M5	Präsentation gehalten	08.10.2026

Soll = geplante Termine, berechnet aus Dauer (Arbeitstage Mo–Fr) und Vorgängern; die Umsetzung beginnt am 01.10. **Ist** wird nach der Durchführung eingetragen. Kürzel in den Grafiken: Y = Yasin, M = Mido, Y+M = beide gemeinsam.

Netzplan

Booklet-Projekt
Yasin & Mido

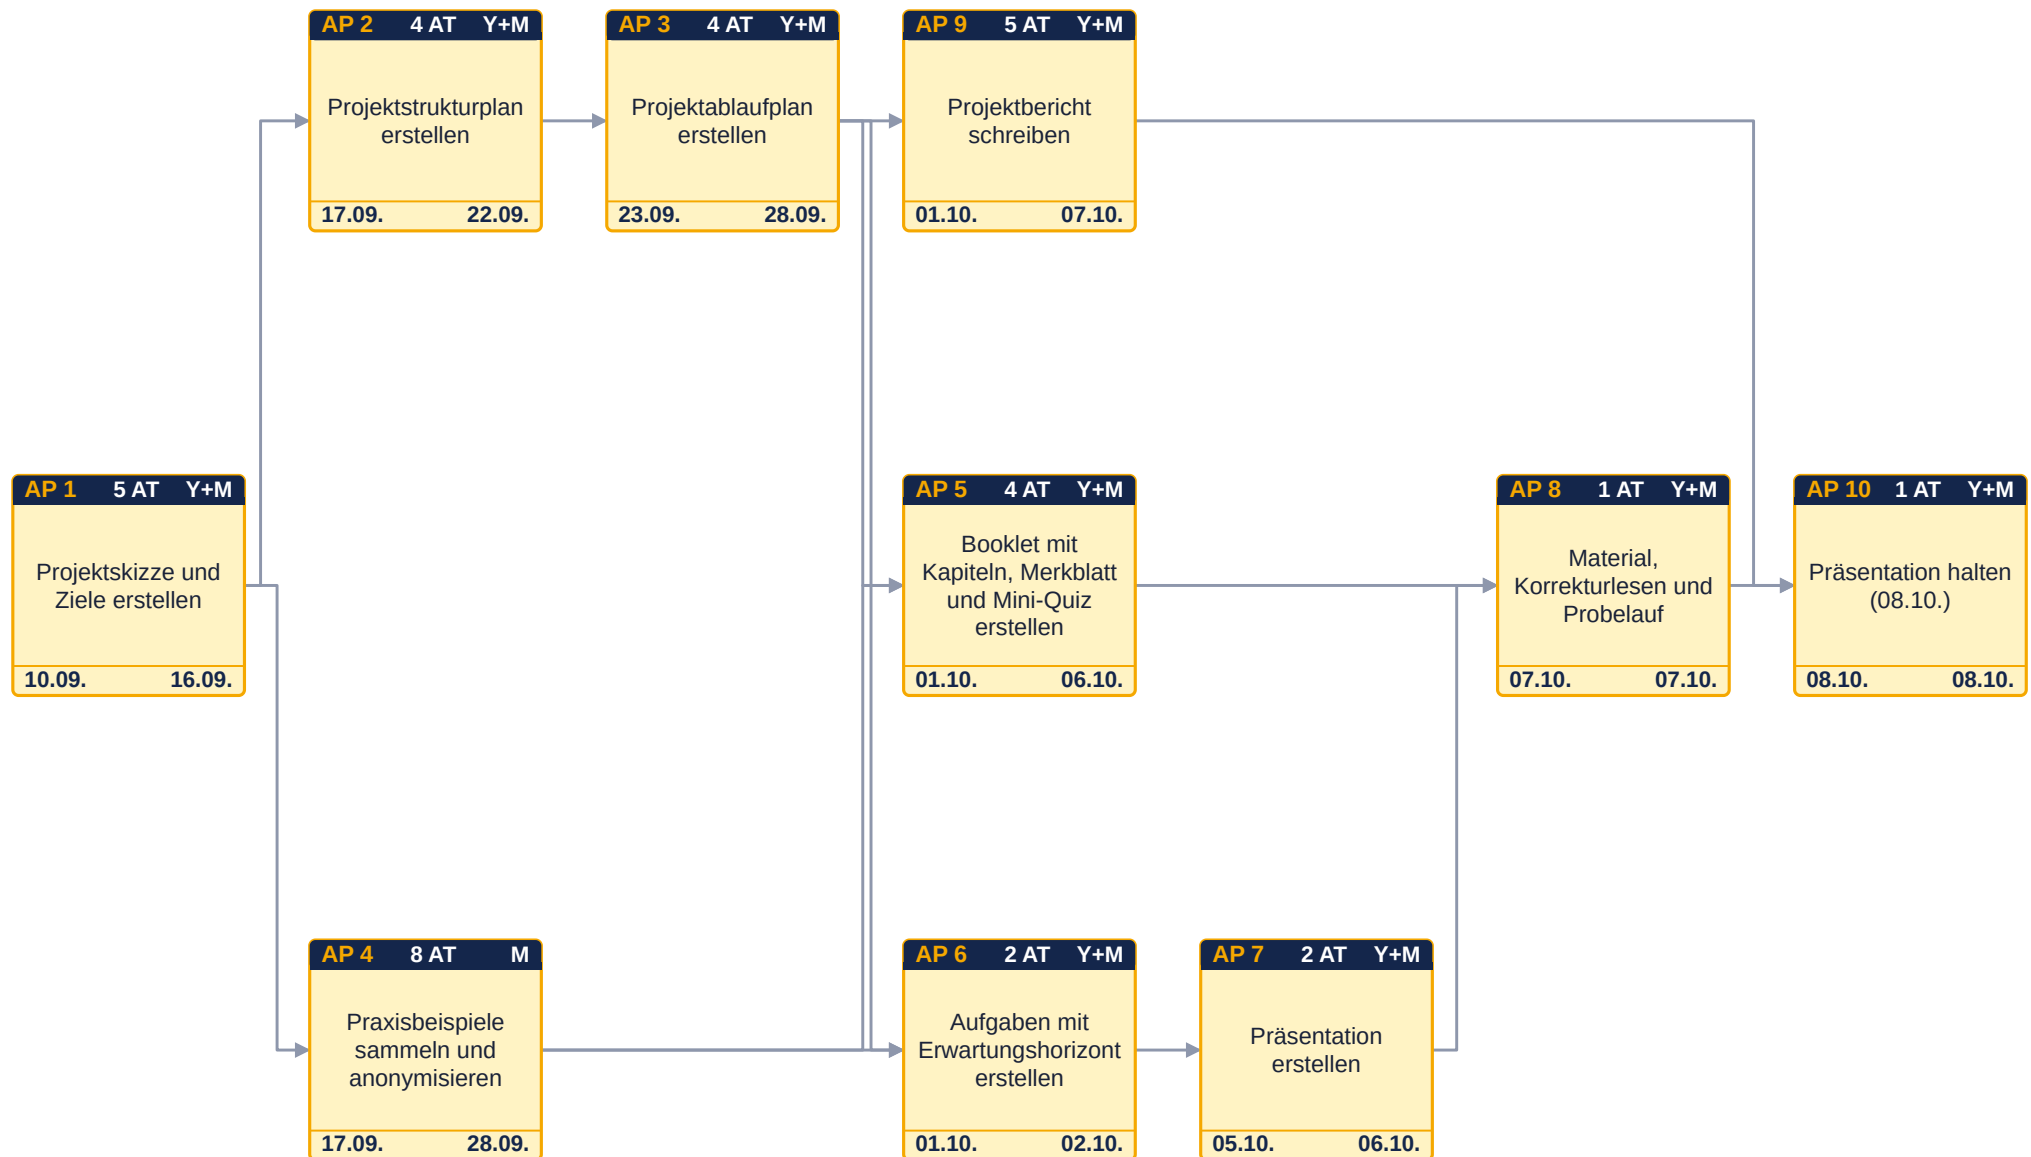

Kästchen: oben Nummer · Dauer in Arbeitstagen (AT) · Verantwortliche (Y = Yasin, M = Mido, Y+M = beide) | Mitte Bezeichnung | unten Start und Ende (Soll). Pfeile zeigen Abhängigkeiten: Der Nachfolger beginnt am nächsten Arbeitstag nach dem Vorgänger. Parallele Arbeitspakete stehen untereinander.

