


Ablauftabelle mit Soll-Terminen

Laufzeit 10.09. bis 08.10.2026 · 21 Arbeitstage (Montag bis Freitag) · Wasserfallmodell

AP	Arbeitspaket	Verantwortlich	Dauer (AT)	Start	Ende	Vorgänger
1	Projektmanagement und Planung					
1.1	Projektskizze und SMART-Ziele erstellen	Yasin & Mido	3	10.09.2026	14.09.2026	–
1.2	Projektstrukturplan erstellen	Mido	2	15.09.2026	16.09.2026	1.1
1.3	Projektablaufplan erstellen	Mido	2	17.09.2026	18.09.2026	1.2
2	Recherche					
2.1	Gesetzliche Grundlagen recherchieren (BBiG, JArbSchG, BUrlG, ArbZG)	Yasin	4	15.09.2026	18.09.2026	1.1
2.2	Prüfungsrelevante Inhalte und Fallbeispiele auswählen	Mido	2	21.09.2026	22.09.2026	2.1, 1.3
2.3	Quellen und Zahlen prüfen (Stand Oktober 2026)	Yasin & Mido	2	23.09.2026	24.09.2026	2.2
3	Booklet					
3.1	Erklär-Themen schreiben	Yasin	3	25.09.2026	29.09.2026	2.3
3.2	Aufgaben mit Erwartungshorizont erstellen	Mido	3	25.09.2026	29.09.2026	2.3
3.3	Layout, Merkblatt und Korrekturlesen	Mido	2	30.09.2026	01.10.2026	3.1, 3.2
4	Präsentation und Unterrichtsstunde (inkl. Website)					
4.1	Unterrichtsstunde planen und Folien erstellen	Yasin	3	30.09.2026	02.10.2026	3.1, 3.2
4.2	Interaktive Website mit QR-Code	Mido	2	02.10.2026	05.10.2026	3.2
4.3	Sprechskript schreiben	Yasin	2	05.10.2026	06.10.2026	4.1
5	Abschluss und Evaluation					
5.1	Probelauf und Material prüfen	Yasin & Mido	1	07.10.2026	07.10.2026	3.3, 4.2, 4.3
5.2	Präsentation halten	Yasin & Mido	1	08.10.2026	08.10.2026	5.1
5.3	Evaluation, Reflexion und Projektbericht	Yasin & Mido	–	nach 08.10.2026	[laut Lehrkraft]	5.2

Gantt-Diagramm

Balken: Navy = Yasin · Orange = Mido · gestreift = beide · rote Raute = Meilenstein (Ende des Tages)

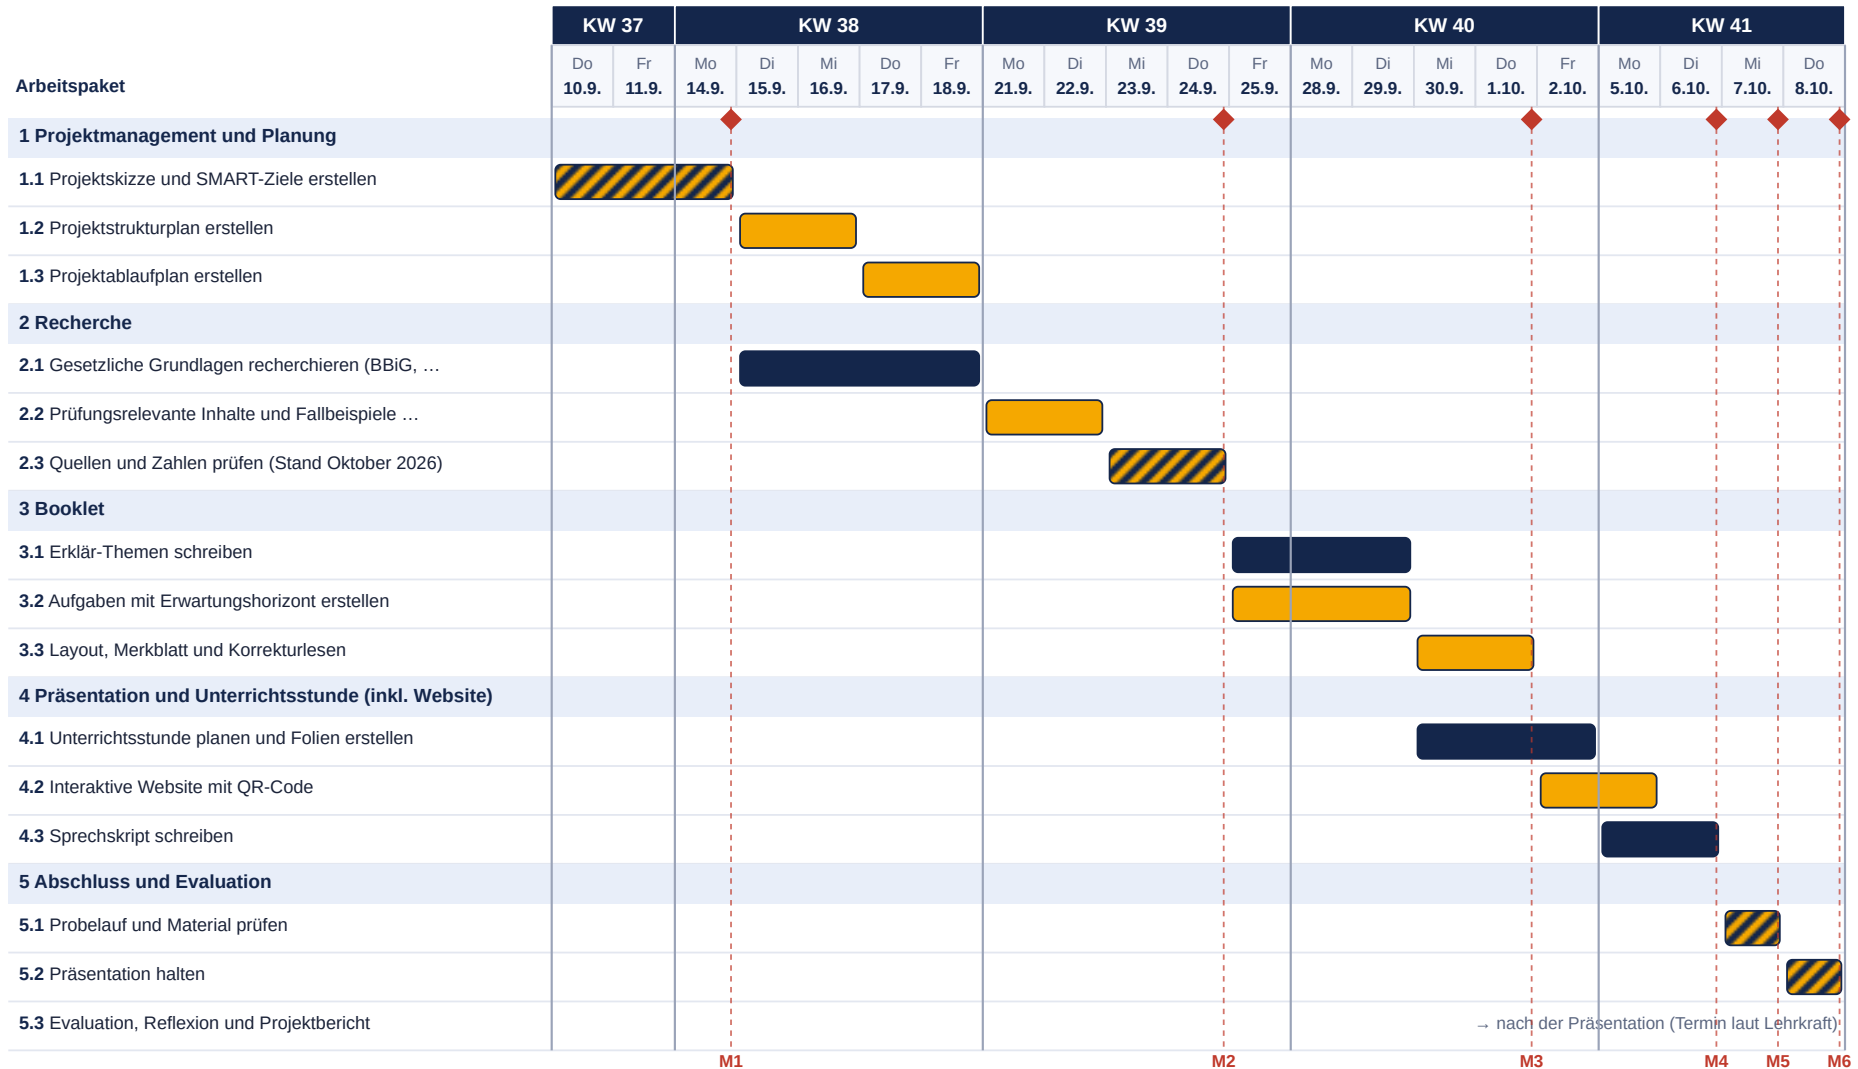

Meilensteine und kritischer Weg

Nr.	Meilenstein	Termin
M1	Themenfreigabe (Projektskizze liegt vor)	14.09.2026
M2	Recherche abgeschlossen	24.09.2026
M3	Booklet fertig	01.10.2026
M4	Präsentation fertig (Folien und Sprechskript)	06.10.2026
M5	Probelauf	07.10.2026
M6	Präsentation am 08.10.2026	08.10.2026

Kritischer Weg (kein Puffer, Verzug verschiebt die Präsentation): 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2.

Puffer: AP 3.3 hat 3 Arbeitstage, AP 4.2 hat 1 Arbeitstag Puffer.

Die Termine sind Soll-Termine aus Dauer, Vorgängern und frühestem Start (AP 4.2 frühestens am 02.10.2026). Tatsächliche Termine (Ist) werden im Projektbericht gegenübergestellt.
