


Tabelle der Arbeitspakete

Nr.	Arbeitspaket	Dauer (Arbeitstage)	Start (Soll)	Ende (Soll)	Vorgänger	Verantwortlich	Ist
1	Projektskizze und Ziele erstellen	5	10.09.2026	16.09.2026	–	Yasin & Mido	[eintragen]
2	Projektstrukturplan erstellen	4	17.09.2026	22.09.2026	1	Yasin & Mido	[eintragen]
3	Projektablaufplan erstellen	4	23.09.2026	28.09.2026	2	Yasin & Mido	[eintragen]
4	Praxisbeispiele sammeln und anonymisieren	8	17.09.2026	28.09.2026	1	Mido	[eintragen]
5	Booklet mit Kapiteln, Merkblatt und Mini-Quiz erstellen	4	01.10.2026	06.10.2026	3, 4	Yasin & Mido	[eintragen]
6	Aufgaben mit Erwartungshorizont erstellen	2	01.10.2026	02.10.2026	3, 4	Yasin & Mido	[eintragen]
7	Interaktive Website mit QR-Code	2	01.10.2026	02.10.2026	3, 4	Yasin & Mido	[eintragen]
8	Präsentation erstellen	2	05.10.2026	06.10.2026	6, 7	Yasin & Mido	[eintragen]
9	Material, Korrekturlesen und Probelauf	1	07.10.2026	07.10.2026	5, 8	Yasin & Mido	[eintragen]
10	Projektbericht schreiben	5	01.10.2026	07.10.2026	3	Yasin & Mido	[eintragen]
11	Präsentation halten (08.10.)	1	08.10.2026	08.10.2026	9, 10	Yasin & Mido	[eintragen]

Nr.	Meilenstein (Soll)	Termin
M1	Projektskizze und Ziele fertig	16.09.2026
M2	Planung und Praxisbeispiele fertig	28.09.2026
M3	Booklet und Aufgaben fertig	06.10.2026
M4	Präsentation und Material fertig	07.10.2026
M5	Präsentation gehalten	08.10.2026

Soll = geplante Termine, berechnet aus Dauer (Arbeitstage Mo–Fr) und Vorgängern; die Umsetzung beginnt am 01.10. **Ist** wird nach der Durchführung eingetragen. Kürzel in den Grafiken: Y = Yasin, M = Mido, Y+M = beide gemeinsam.

Netzplan

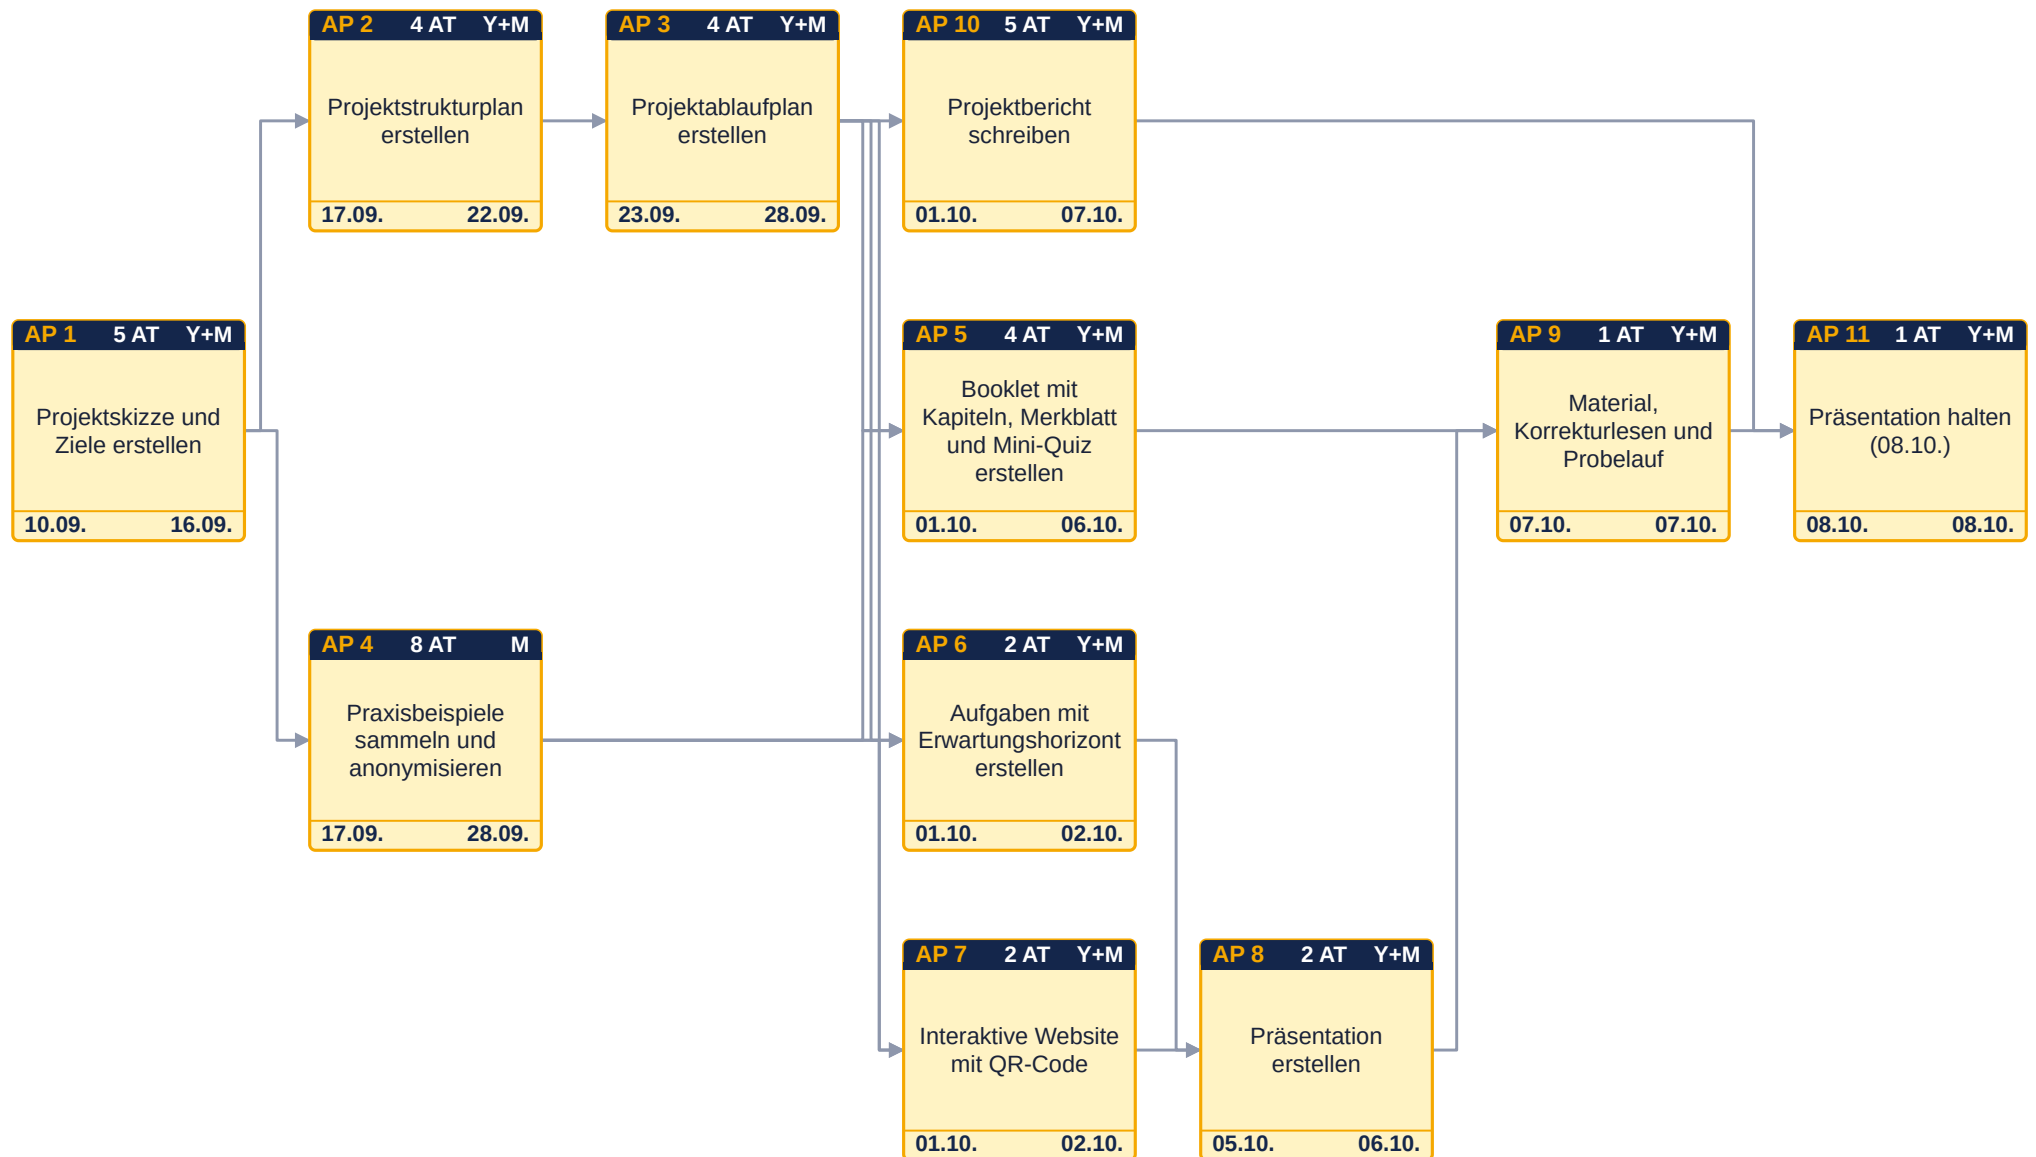

Kästchen: oben Nummer · Dauer in Arbeitstagen (AT) · Verantwortliche (Y = Yasin, M = Mido, Y+M = beide) | Mitte Bezeichnung | unten Start und Ende (Soll). Pfeile zeigen Abhängigkeiten: Der Nachfolger beginnt am nächsten Arbeitstag nach dem Vorgänger. Parallele Arbeitspakete stehen untereinander.

