

PROJEKTBERICHT

Anhang

Projektplanung: Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag

Booklet-Projekt · Präsentation am 08.10.2026

Projektskizze	Seite 2
Projektstrukturplan	Seite 4
Projektablaufplan (Tabelle, Netzplan, Gantt-Diagramm)	Seite 5

PROJEKTSKIZZE

Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag

Themenschwerpunkt Verkürzer · Kaufleute für Büromanagement · Präsentation am 08.10.2026

1. Vorläufiger Arbeitstitel

Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag – Prüfungsvorbereitungsbuchlet für die IHK-Abschlussprüfung in Wirtschafts- und Sozialkunde

2. Einreicher / Ansprechpartner

Yasin & Mido · [Klasse und Kontakt eintragen]

3. Vorläufige Umschreibung der Projektidee

Wir werden ein Prüfungsvorbereitungsbuchlet zu einem Thema der schriftlichen IHK-Abschlussprüfung in Wirtschafts- und Sozialkunde erstellen: „Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag“ (Unterpunkt 0103 im Prüfungskatalog). Auf 25 Seiten soll es die sechs Prüfungsinhalte – Beginn und Dauer der Ausbildung, tägliche Ausbildungszeit, Vergütung, Urlaub, Probezeit und Kündigung – sowie die Pflichten von Auszubildenden und Ausbildenden in einfacher Sprache erklären. Rechtsgrundlage ist vor allem das Berufsbildungsgesetz (BBiG).

Das Booklet wird ein Merkblatt für eine Seite, Aufgaben im Prüfungsformat mit Erwartungshorizont (Lösung, Paragraph, Begründung), drei Quizrunden sowie Glossar und Quellenverzeichnis enthalten. Die Praxisbeispiele sollen aus einem anonymisierten, eigenen Ausbildungsvertrag stammen.

Ergänzend planen wir eine 45-minütige Präsentation mit anschließendem Prüfungstraining für die Klasse (fünf Stationen), ein Quiz als HTML-Datei und einen Projektbericht.

4. Vorteile / erwarteter Nutzen

- **Mitschüler:** Zum Ausbildungsvertrag gibt es bisher kein kompaktes Lernmaterial mit Aufgaben und Lösungen. Unser Booklet erklärt die Regeln in einfacher Sprache statt Gesetzesdeutsch und bereitet auf die Abschlussprüfung am 25.11.2026 vor.
- **Prüfungsnah:** Wirtschafts- und Sozialkunde dauert 60 Minuten, besteht aus fallbezogenen Aufgaben und zählt 10 % der Gesamtnote. Unsere Aufgaben ahmen das nach: kurzer Fall, Antworten A–D, genau eine Lösung.
- **Wir selbst:** Wir lernen die Regeln aus dem eigenen Ausbildungsvertrag sicher anzuwenden und wenden die Methoden aus dem Projektmanagement-Unterricht praktisch an.

5. Umsetzung

Wir arbeiten nach dem Wasserfall-Modell, also Phase für Phase, weil Anforderungen, Termin und Ergebnis von Anfang an feststehen. Die Arbeit gliedert sich in sechs Stufen, die im Projektstrukturplan als Teilaufgaben und Arbeitspakete (AP) wiederkehren:

	Stufe	Inhalt	AP
1	Planung	Problemanalyse und Zielsetzung, Projektplanung	1–2
2	Recherche & Konzeption	BBiG und Berufsausbildungsvertrag recherchieren, eigenen Vertrag sichten und anonymisieren, Gliederung erstellen	3–5
3	Booklet	Texte, Praxisbeispiele und Grafiken, Layout; Übungsteil mit Merkblatt, Aufgaben samt Erwartungshorizont und Quizfragen	6–11
4	Präsentation & Praxisteil	Präsentation mit Prüfungstraining, Quiz als HTML-Datei, Druckmaterial, Generalprobe	12–15
5	Qualitätssicherung	Fachlicher Abgleich mit dem BBiG, Korrekturlesen und Probelesen	16–17
6	Projektbericht & Abgabe	Projektbericht schreiben, Abgabe und Präsentation am 08.10.2026	18–19

Aufgabenverteilung: Recherche und Texte liegen bei Yasin; Vertragssichtung, Praxisbeispiele, Grafiken und Korrekturlesen bei Mido; Gliederung, Layout und Präsentation machen wir gemeinsam. Projektstrukturplan und Projektablaufplan liegen im Anhang.

6. Laufzeit

4 Wochen (10.09. – 08.10.2026), geplant in Arbeitstagen Montag bis Freitag:

Zeitraum	Schwerpunkt	AP
Woche 1 (10.09.–16.09.)	Planung, Recherche, Vertragssichtung, Beginn der Gliederung	1–5
Woche 2 (17.09.–23.09.)	Gliederung abschließen, Texte und Praxisbeispiele beginnen, Projektbericht beginnen	5–7, 18
Woche 3 (24.09.–30.09.)	Texte und Beispiele abschließen, Merkblatt, Aufgaben mit Erwartungshorizont, Quizfragen; Start von Layout, Präsentation, Quiz-Datei und Druckmaterial	6–14, 18
Woche 4 (01.10.–07.10.)	Layout, Präsentation, Quiz-Datei, Druckmaterial, Generalprobe, Qualitätssicherung, Projektbericht	8, 12–18
08.10.2026	Abgabe und Präsentation	19

Meilensteine: M1 Recherche abgeschlossen (15.09.) · M2 Gliederung steht (18.09.) · M3 Texte und Beispiele fertig (29.09.) · M4 Booklet fertig und geprüft (07.10.) · M5 Präsentation (08.10.).

7. Finanzierung

Für das Projekt entstehen keine nennenswerten Kosten. Benötigt werden digitale Recherchemittel, ein Computer und ein Canva-Zugang für das Layout (vorhanden). Für den Druck von Booklet, Merkblatt und Kartensets: [Anzahl der Ausdrücke und Drucker klären].

Unsere zwei SMART-Ziele

Ziel 1 – Wissen über den Ausbildungsvertrag

Bis zum 08.10.2026 kennen wir die wichtigsten Regelungen aus Berufsbildungsgesetz und Ausbildungsvertrag und können für jeden der sechs Prüfungspunkte (Beginn und Dauer, tägliche Ausbildungszeit, Vergütung, Urlaub, Probezeit, Kündigung) mindestens ein Beispiel erklären. Das Booklet deckt alle sechs Punkte jeweils mit Aufgaben und Lösung ab.

Zum Beispiel:


- Beginn und Dauer** → Verkürzung auf gemeinsamen Antrag von Azubi und Auszubildenden (§ 8 Abs. 1 BBiG)
- Tägliche Ausbildungszeit** → Jugendliche höchstens 8 Stunden täglich (§ 8 JArbSchG)
- Vergütung** → mindestens 724 € im 1. Jahr bei Ausbildungsbeginn 2026 (§ 17 BBiG)
- Urlaub** → ab 18 Jahren mindestens 24 Werktage, darunter 25, 27 oder 30 (§ 3 BUrlG, § 19 JArbSchG)
- Probezeit** → ein bis vier Monate (§ 20 BBiG)
- Kündigung** → in der Probezeit jederzeit ohne Frist, aber schriftlich (§ 22 Abs. 1 und 3 BBiG)

Ziel 2 – Anwendung im Ausbildungsalltag

Bis zur Präsentation am 08.10.2026 können Mitschüler mit dem Booklet typische Situationen der passenden Regelung zuordnen: Im Abschluss-Quiz mit fünf neuen Situationen erreichen sie im Durchschnitt mindestens 4 von 5 richtige Antworten (80 %).

Zum Beispiel:

- Azubi will in der Probezeit kündigen** → jederzeit ohne Frist, schriftlich (§ 22 Abs. 1 und 3 BBiG)
- 16-Jähriger fragt nach Mindesturlaub** → 27 Werktage (§ 19 JArbSchG)
- Betrieb bietet im 1. Jahr (Beginn 2026) 600 € an** → unzulässig, mindestens 724 € (§ 17 BBiG)
- Azubi will nach der Probezeit den Beruf wechseln** → Kündigung mit vier Wochen Frist, schriftlich (§ 22 Abs. 2 und 3 BBiG)
- Arbeitstag vor der schriftlichen Abschlussprüfung** → Betrieb muss freistellen (§ 15 BBiG)

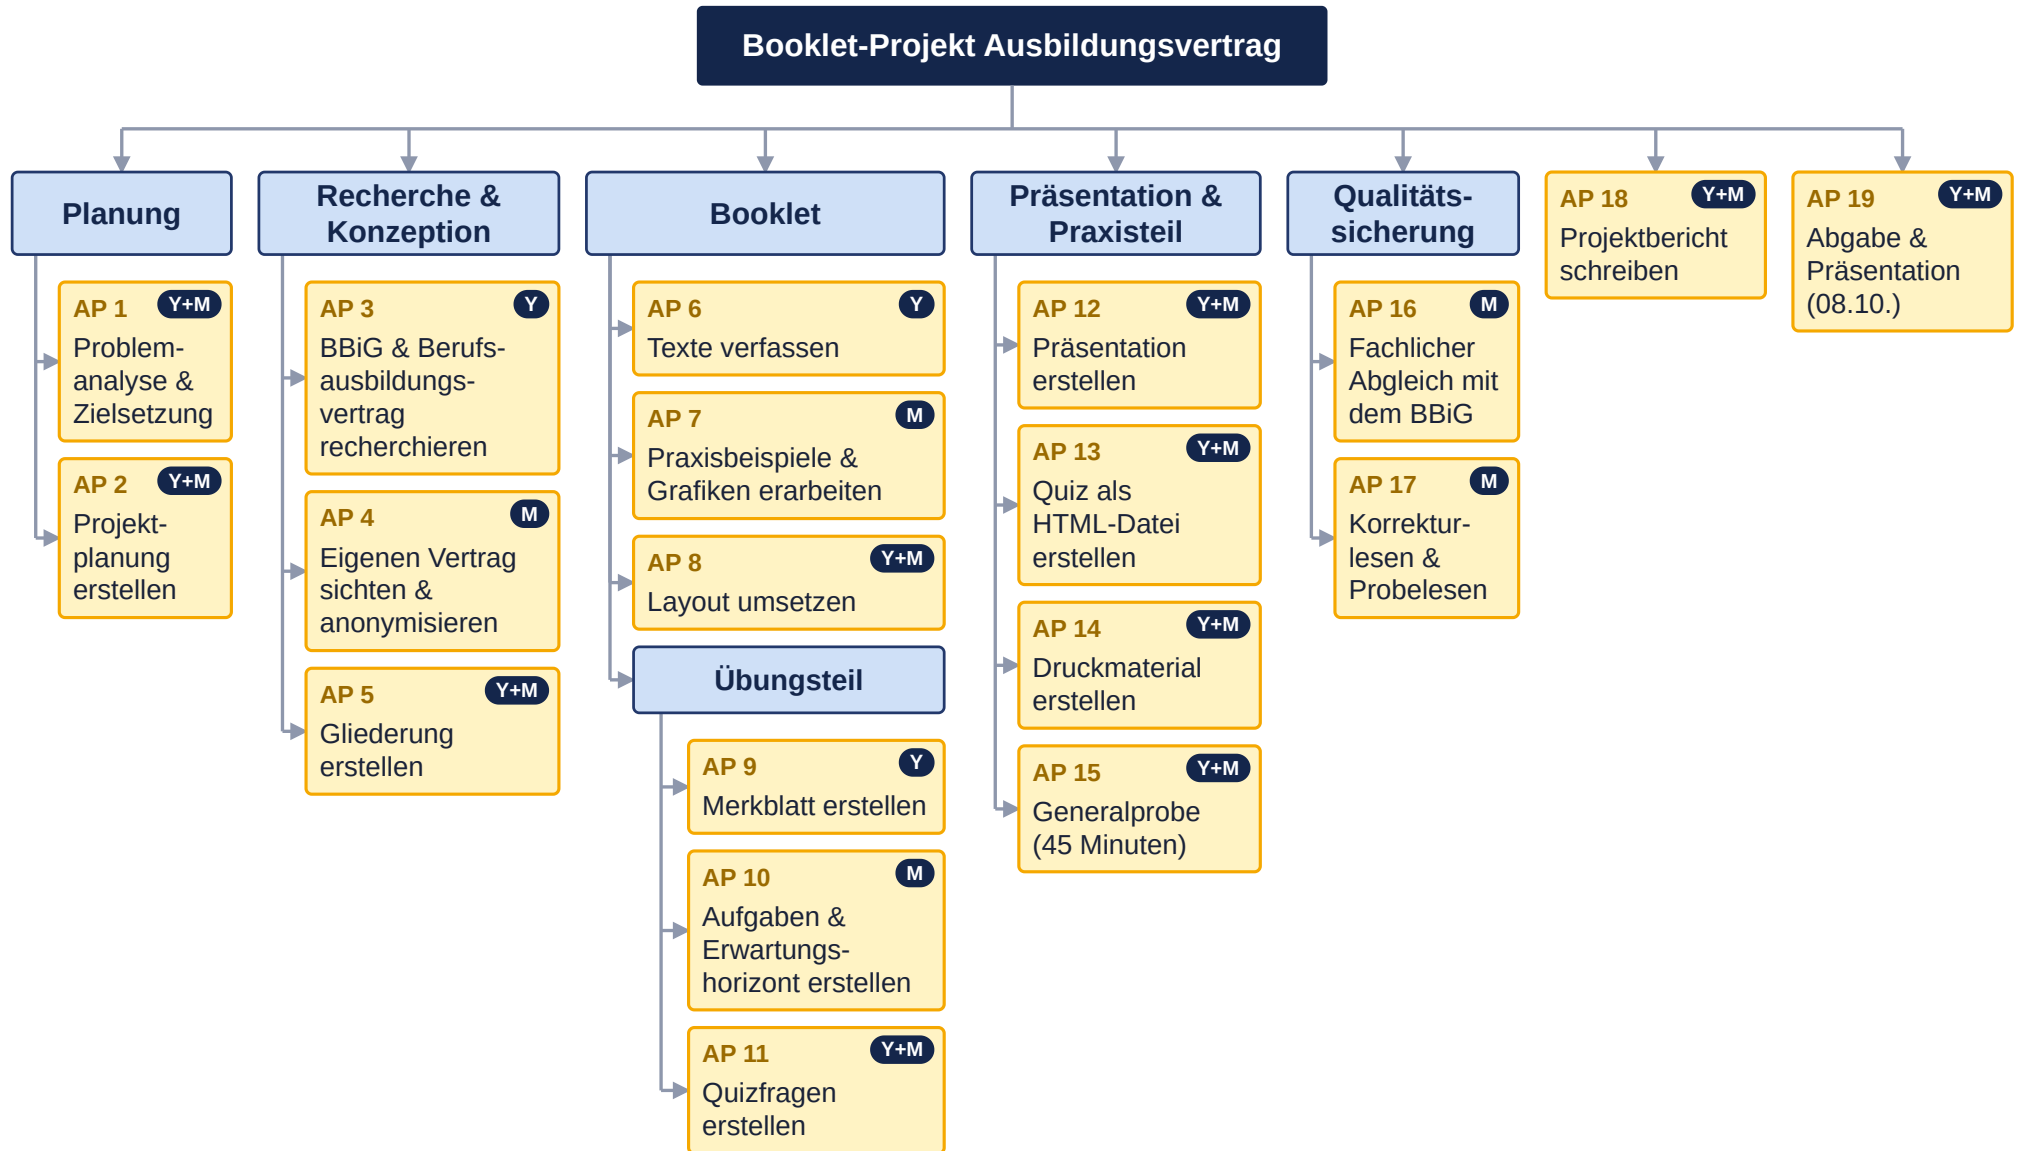

Teilaufgabe

Arbeitspaket (AP)

Verantwortlich: Y = Yasin · M = Mido · Y+M = beide gemeinsam

Tabelle der Arbeitspakete


Booklet-Projekt
Yasin & Mido

Nr.	Arbeitspaket	Dauer (Arbeitstage)	Start (Soll)	Ende (Soll)	Vorgänger	Verantwortlich	Ist
1	Problemanalyse & Zielsetzung	1	10.09.2026	10.09.2026	–	Yasin & Mido	[eintragen]
2	Projektplanung erstellen	2	11.09.2026	14.09.2026	1	Yasin & Mido	[eintragen]
3	BBiG & Berufsausbildungsvertrag recherchieren	3	11.09.2026	15.09.2026	1	Yasin	[eintragen]
4	Eigenen Vertrag sichten & anonymisieren	2	11.09.2026	14.09.2026	1	Mido	[eintragen]
5	Gliederung erstellen	3	16.09.2026	18.09.2026	3, 4	Yasin & Mido	[eintragen]
6	Texte verfassen	5	21.09.2026	25.09.2026	5	Yasin	[eintragen]
7	Praxisbeispiele & Grafiken erarbeiten	4	21.09.2026	24.09.2026	4, 5	Mido	[eintragen]
8	Layout umsetzen	4	30.09.2026	05.10.2026	9, 10, 11	Yasin & Mido	[eintragen]
9	Merkblatt erstellen	2	28.09.2026	29.09.2026	6	Yasin	[eintragen]
10	Aufgaben & Erwartungshorizont erstellen	3	25.09.2026	29.09.2026	7	Mido	[eintragen]
11	Quizfragen erstellen	2	28.09.2026	29.09.2026	6, 7	Yasin & Mido	[eintragen]
12	Präsentation erstellen	4	30.09.2026	05.10.2026	10, 11	Yasin & Mido	[eintragen]
13	Quiz als HTML-Datei erstellen	3	30.09.2026	02.10.2026	10, 11	Yasin & Mido	[eintragen]
14	Druckmaterial erstellen	2	30.09.2026	01.10.2026	10	Yasin & Mido	[eintragen]
15	Generalprobe (45 Minuten)	1	06.10.2026	06.10.2026	12, 13, 14	Yasin & Mido	[eintragen]
16	Fachlicher Abgleich mit dem BBiG	1	06.10.2026	06.10.2026	8	Mido	[eintragen]
17	Korrekturlesen & Probelesen	2	06.10.2026	07.10.2026	8	Mido	[eintragen]
18	Projektbericht schreiben	13	21.09.2026	07.10.2026	2, 5	Yasin & Mido	[eintragen]
19	Abgabe & Präsentation (08.10.)	1	08.10.2026	08.10.2026	15, 17, 18	Yasin & Mido	[eintragen]

Soll = geplante Termine, berechnet aus Dauer (Arbeitstage Mo–Fr) und Vorgängern. Dauer ist die Zeitspanne vom Start bis zum Ende, die Pakete laufen neben Schule und Ausbildung. **Ist** wird nach der Durchführung eingetragen. Kürzel in den Grafiken: Y = Yasin, M = Mido, Y+M = beide gemeinsam.

Netzplan

Booklet-Projekt
Yasin & Mido

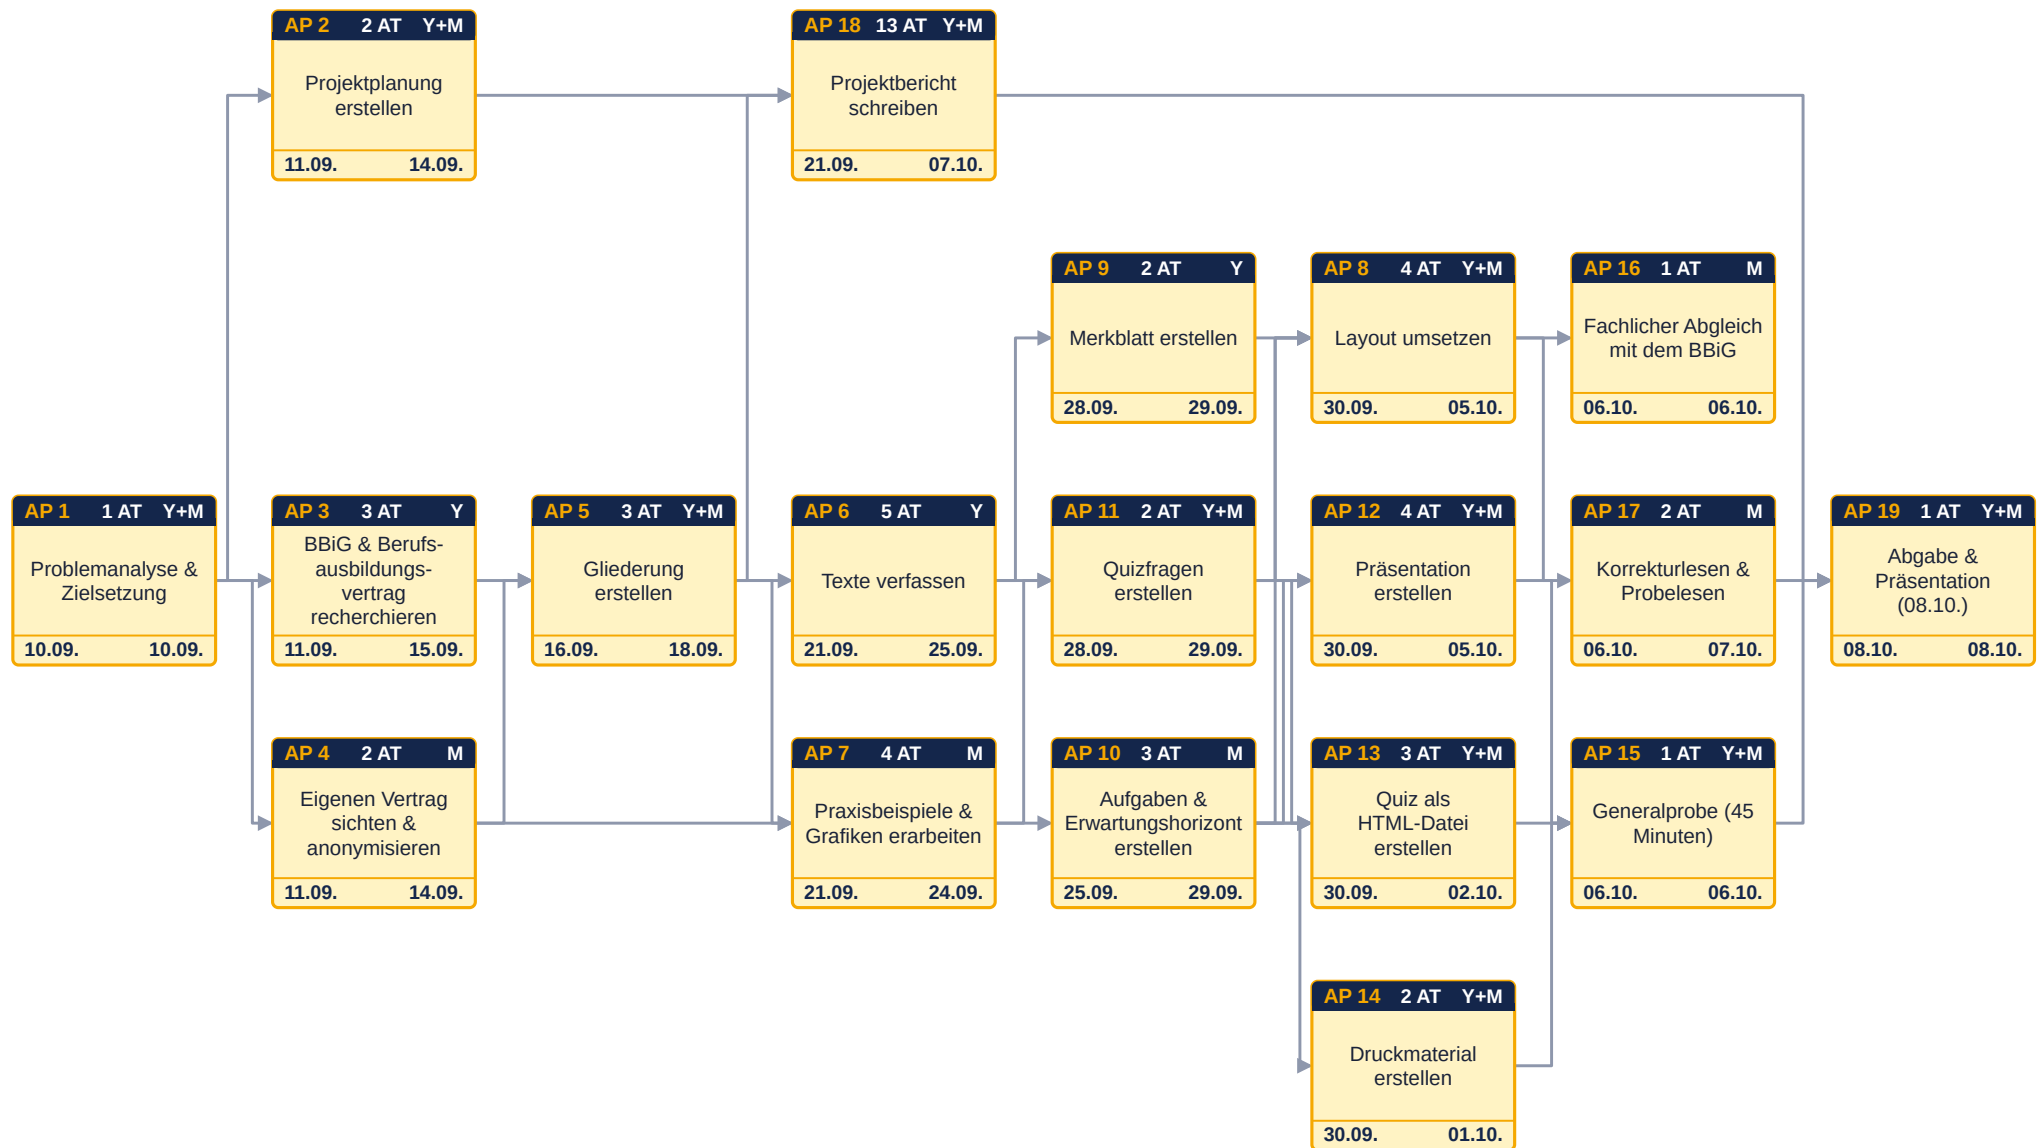

Kästchen: oben Nummer · Dauer in Arbeitstagen (AT) · Verantwortliche (Y = Yasin, M = Mido, Y+M = beide) | Mitte Bezeichnung | unten Start und Ende (Soll).
Pfeile zeigen Abhängigkeiten: Der Nachfolger beginnt am nächsten Arbeitstag nach dem Vorgänger. Parallele Arbeitspakete stehen untereinander.

