


Tabelle der Arbeitspakete

Nr.	Arbeitspaket	Dauer (Arbeitstage)	Start (Soll)	Ende (Soll)	Vorgänger	Verantwortlich	Ist
1	Problemanalyse & Zielsetzung	1	10.09.2026	10.09.2026	–	Yasin & Mido	[eintragen]
2	Projektplanung erstellen	2	11.09.2026	14.09.2026	1	Yasin & Mido	[eintragen]
3	BBiG & Berufsausbildungsvertrag recherchieren	3	11.09.2026	15.09.2026	1	Yasin	[eintragen]
4	Eigenen Vertrag sichten & anonymisieren	2	11.09.2026	14.09.2026	1	Mido	[eintragen]
5	Gliederung erstellen	3	16.09.2026	18.09.2026	3, 4	Yasin & Mido	[eintragen]
6	Texte verfassen	5	21.09.2026	25.09.2026	5	Yasin	[eintragen]
7	Praxisbeispiele & Grafiken erarbeiten	4	21.09.2026	24.09.2026	4, 5	Mido	[eintragen]
8	Layout umsetzen	4	30.09.2026	05.10.2026	9, 10, 11	Yasin & Mido	[eintragen]
9	Merkblatt erstellen	2	28.09.2026	29.09.2026	6	Yasin	[eintragen]
10	Aufgaben & Erwartungshorizont erstellen	3	25.09.2026	29.09.2026	7	Mido	[eintragen]
11	Quizfragen erstellen	2	28.09.2026	29.09.2026	6, 7	Yasin & Mido	[eintragen]
12	Präsentation erstellen	4	30.09.2026	05.10.2026	10, 11	Yasin & Mido	[eintragen]
13	Quiz als HTML-Datei erstellen	3	30.09.2026	02.10.2026	10, 11	Yasin & Mido	[eintragen]
14	Druckmaterial erstellen	2	30.09.2026	01.10.2026	10	Yasin & Mido	[eintragen]
15	Generalprobe (45 Minuten)	1	06.10.2026	06.10.2026	12, 13, 14	Yasin & Mido	[eintragen]
16	Fachlicher Abgleich mit dem BBiG	1	06.10.2026	06.10.2026	8	Mido	[eintragen]
17	Korrekturlesen & Probelesen	2	06.10.2026	07.10.2026	8	Mido	[eintragen]
18	Projektbericht schreiben	13	21.09.2026	07.10.2026	2, 5	Yasin & Mido	[eintragen]
19	Abgabe & Präsentation (08.10.)	1	08.10.2026	08.10.2026	15, 17, 18	Yasin & Mido	[eintragen]

Soll = geplante Termine, berechnet aus Dauer (Arbeitstage Mo–Fr) und Vorgängern. Dauer ist die Zeitspanne vom Start bis zum Ende, die Pakete laufen neben Schule und Ausbildung. **Ist** wird nach der Durchführung eingetragen. Kürzel in den Grafiken: Y = Yasin, M = Mido, Y+M = beide gemeinsam.

Netzplan

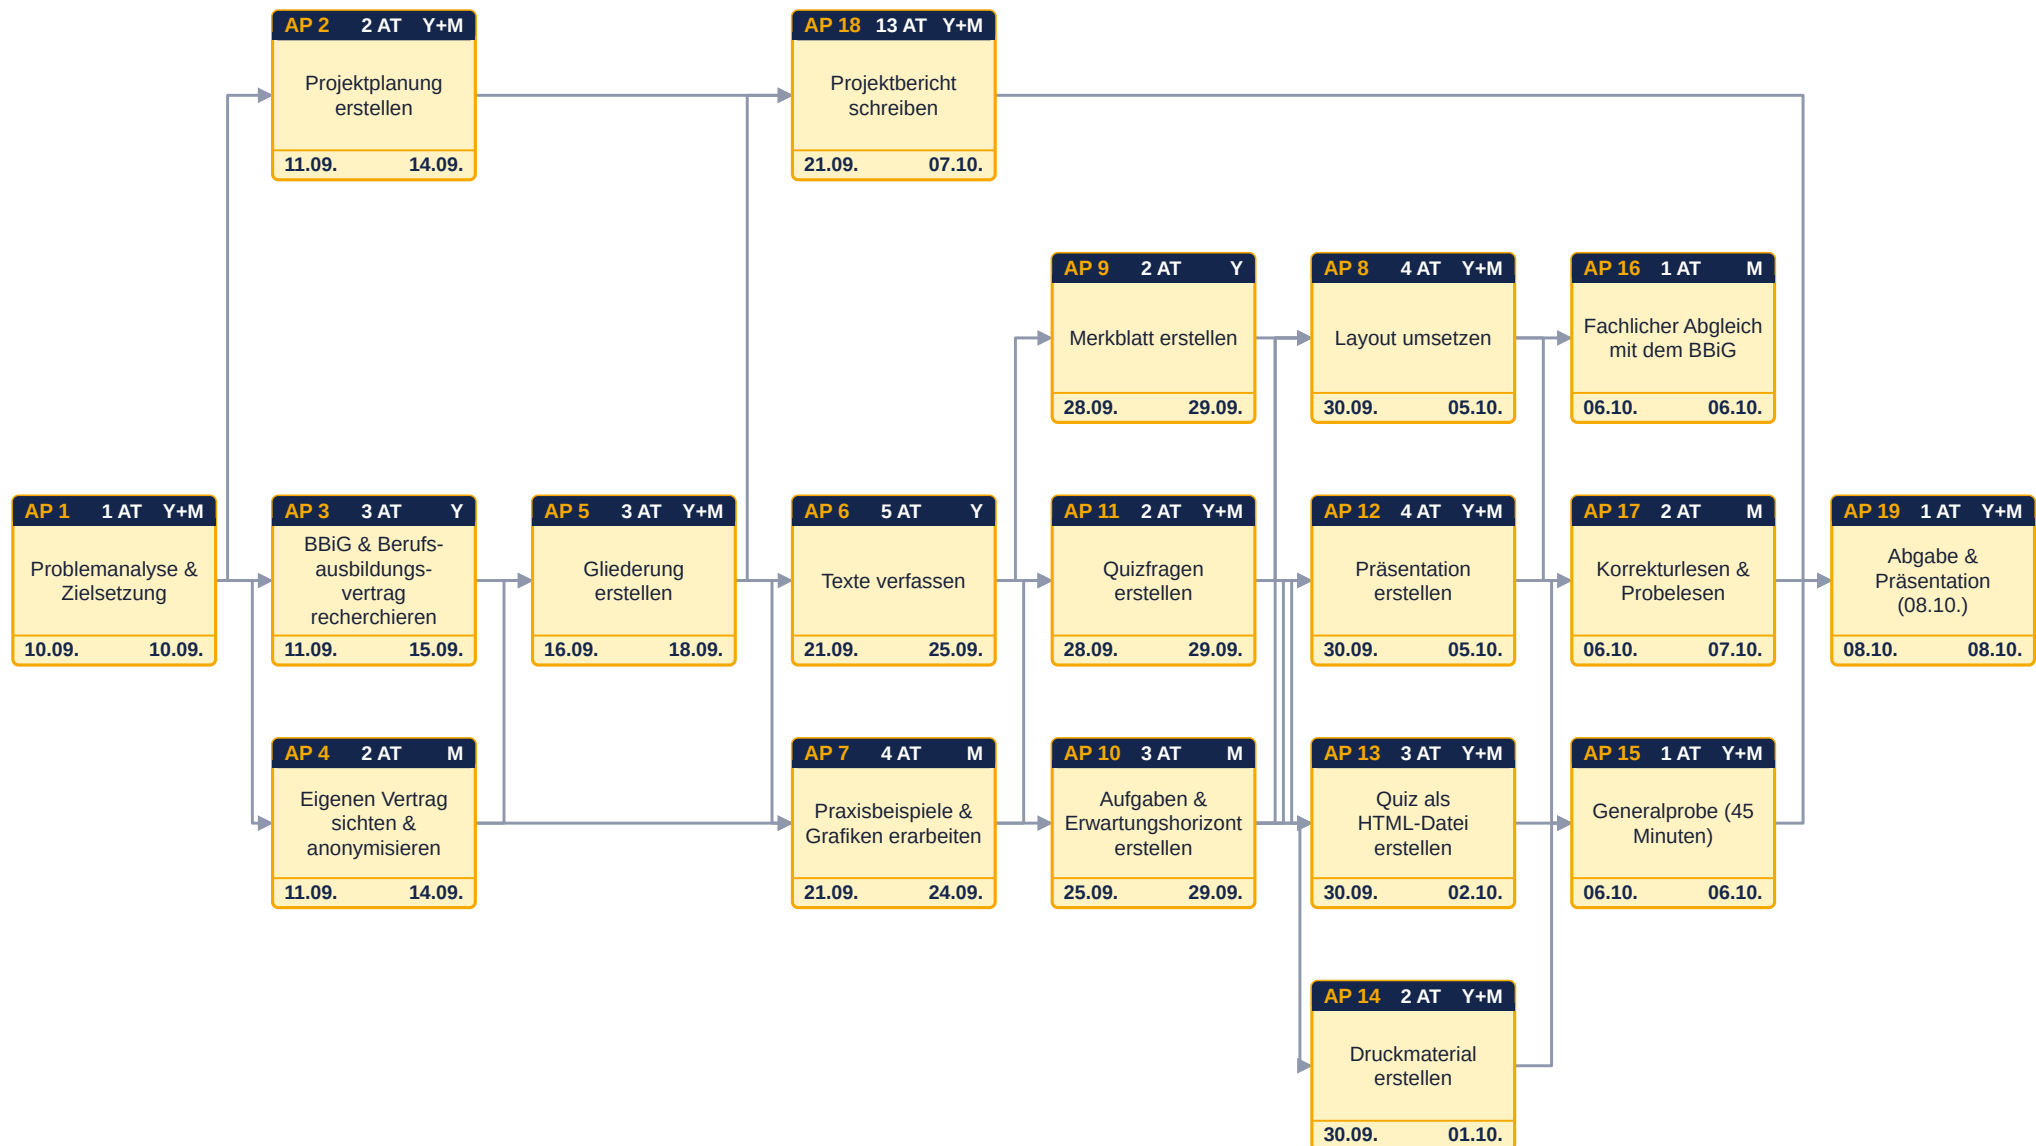

Kästchen: oben Nummer · Dauer in Arbeitstagen (AT) · Verantwortliche (Y = Yasin, M = Mido, Y+M = beide) | Mitte Bezeichnung | unten Start und Ende (Soll).

Pfeile zeigen Abhängigkeiten: Der Nachfolger beginnt am nächsten Arbeitstag nach dem Vorgänger. Parallele Arbeitspakete stehen untereinander.



◆ M1 Recherche abgeschlossen (15.09.) ◆ M2 Gliederung steht (18.09.) ◆ M3 Texte und Beispiele fertig (29.09.) ◆ M4 Booklet fertig und geprüft (07.10.) ◆ M5 Präsentation (08.10.)
